

# Difusión de Casos Fatales


Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Construcción

## Trabajador Muere Aplastado por Derrumbe

### Descripción

El trabajador ingresa a la excavación sin observar las condiciones del área de trabajo. Mientras realizaba sus labores, la placa de compactadora se desprende, aplastando al trabajador contra el muro de la zanja, muriendo al instante.

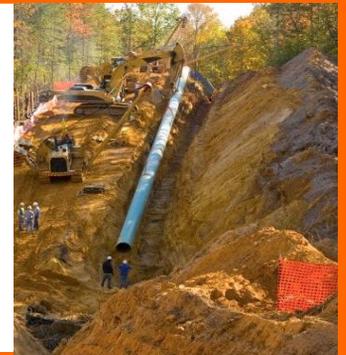

### Causas / Análisis del accidente

- Falta de entibación en la pared de la excavación al momento de estar desarrollando la tarea de compactación de la faena.
- Análisis técnico inadecuado del personal especializado en obra, referido a las condiciones del suelo de la zona excavada y la consideración de seguridad en el trabajo de compactación y relleno.

### Recomendaciones

- Se deberá realizar el fortalecimiento de todas las actividades preventivas en los procesos de planificación y desarrollo de ejecución de obras, asegurando la ausencia de situaciones fuera de control.
- Realizar un adecuado análisis de los riesgos involucrados en las obras en ejecución, dando énfasis a los cambios de las condiciones en las distintas etapas de la obra.
